PRODUKTIONSOVERSIGT

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**Ryparken**	**275 dage**	**ma 12-06-17**	**fr 29-06-18**
2	Indretning af byggeplads	5 dage	ma 26-06-17	fr 30-06-17
3	**Blok 1,1**	**95 dage**	**ma 12-06-17**	**fr 20-10-17**
10	**Blok 1,2**	**80 dage**	**ma 24-07-17**	**fr 10-11-17**
17	**Blok 2**	**70 dage**	**ma 14-08-17**	**fr 17-11-17**
24	**Blok 3**	**68 dage**	**ma 11-09-17**	**on 13-12-17**
25	Opsætning af stillads (inkl flyt overdækning)	20 dage	ma 11-09-17	fr 06-10-17
26	Nedrivning	5 dage	ma 02-10-17	fr 06-10-17
27	Tømrerarbejder	20 dage	ma 09-10-17	fr 03-11-17
28	Blikarbejder	5 dage	on 01-11-17	ti 07-11-17
29	Teglarbejder	11 dage	on 08-11-17	on 22-11-17
30	Nedtagning af stillads (inkl flyt overdækning)	15 dage	to 23-11-17	on 13-12-17
31	**Blok 5**	**65 dage**	**ma 09-10-17**	**fr 05-01-18**
38	**Blok 4**	**65 dage**	**ma 06-11-17**	**fr 02-02-18**
45	**Blok 6**	**65 dage**	**ma 04-12-17**	**fr 02-03-18**
52	**Blok 7**	**65 dage**	**ma 01-01-18**	**fr 30-03-18**
59	**Blok 9**	**65 dage**	**ma 29-01-18**	**fr 27-04-18**
66	**Blok 8**	**65 dage**	**ma 26-02-18**	**fr 25-05-18**
73	**Blok 10**	**65 dage**	**ma 26-03-18**	**fr 22-06-18**
80	**Blok 11**	**50 dage**	**ma 23-04-18**	**fr 29-06-18**
87	**Afrigning af byggeplads**	15 dage	ma 11-06-18	fr 29-06-18
88				

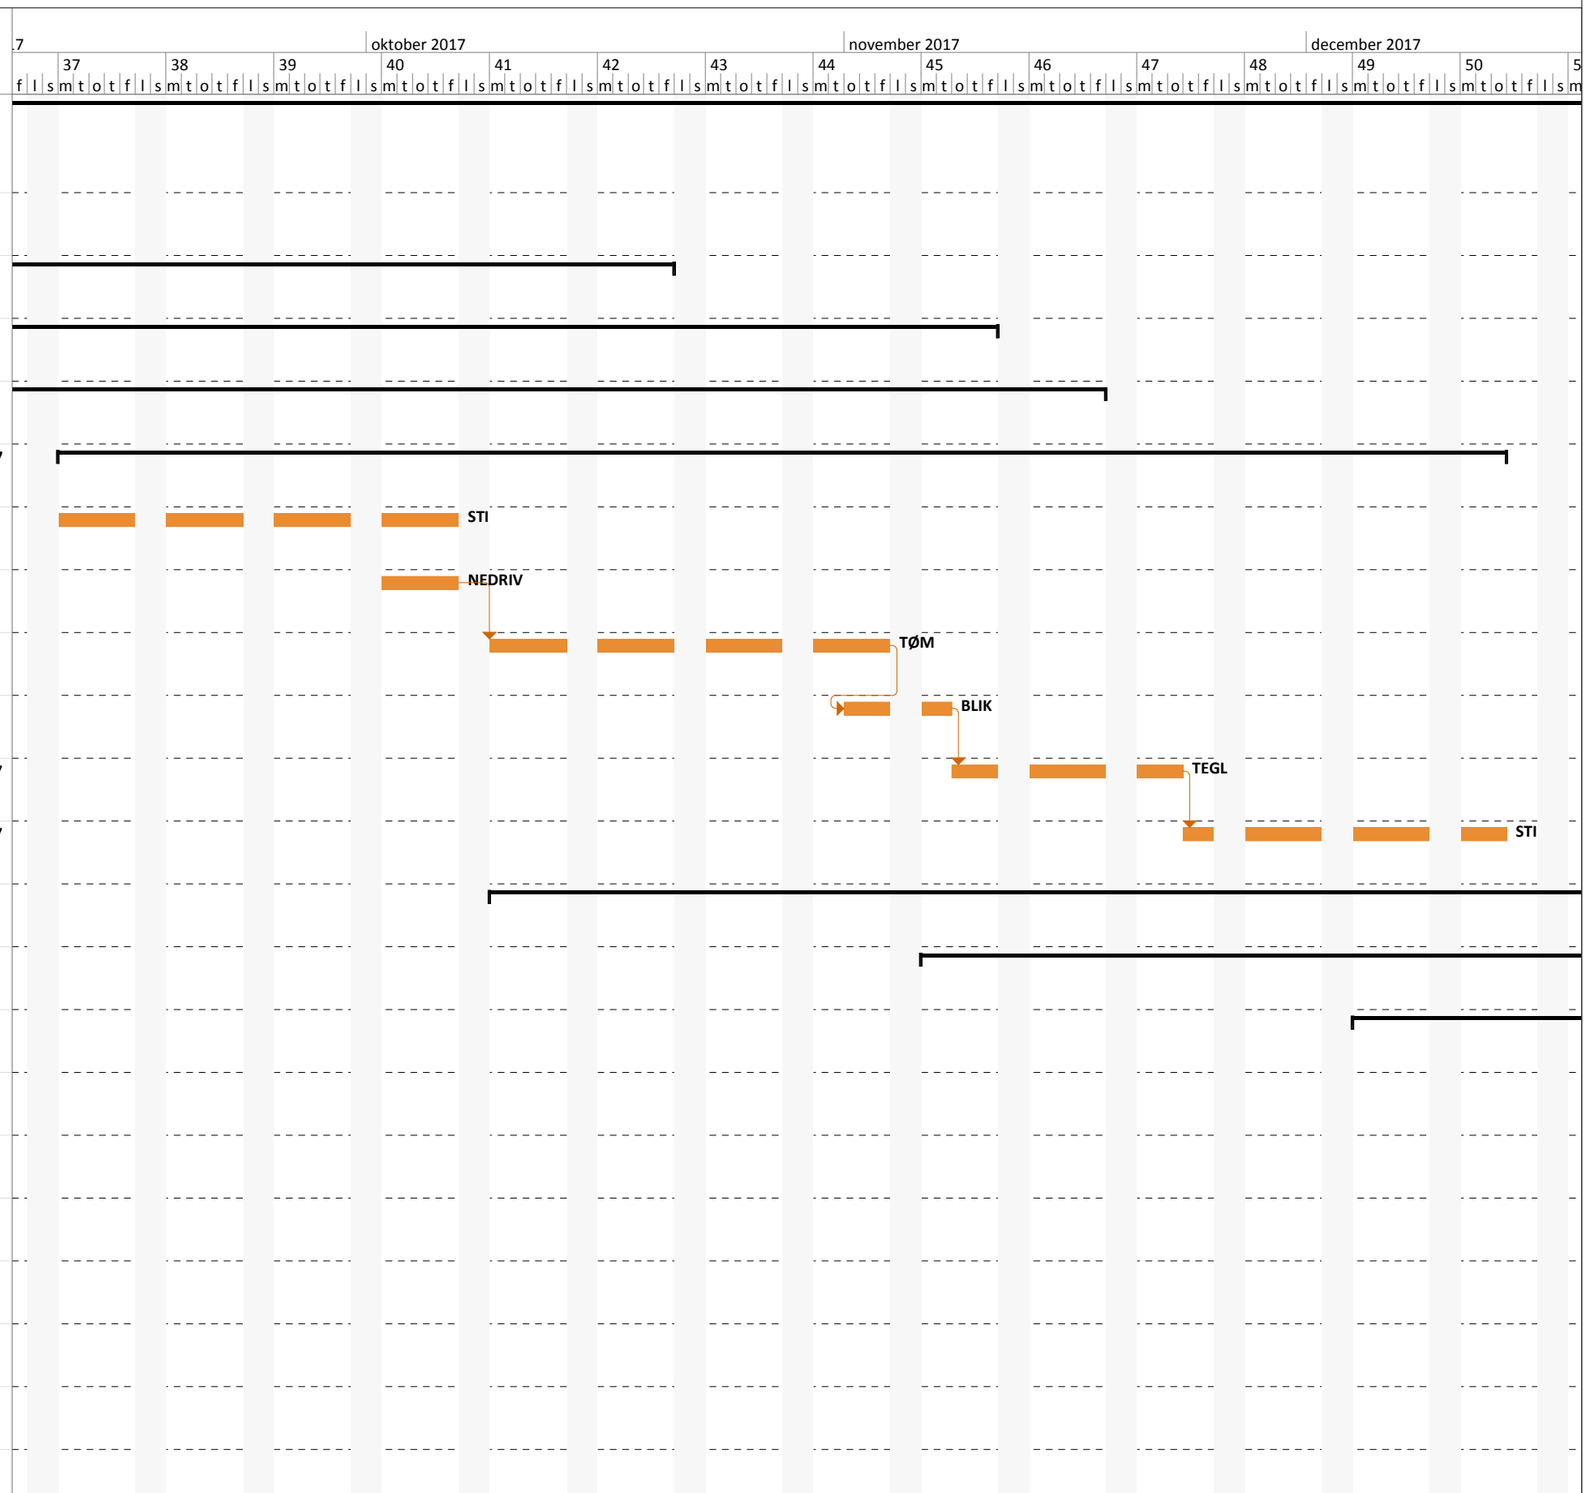

BYENS TAG & FACADE A/S
Bådehavnsgade 12
2450 København SV
